

Herzlich Willkommen zur

ECMS Info Session

Bitte haben Sie noch einen Moment
Geduld.

Die Veranstaltung startet in Kürze.

Wichtige Hinweise

- Bei Fragen nutzen Sie bitte den Chat an „alle Diskussionsteilnehmer“.
- Bei Audioproblemen verwenden Sie bitte die telefonischen Einwahldaten aus der Einladung.



- 1. Einleitung**
- 2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen**
- 3. Testphasen – Durchführung der User Tests**
- 4. Migration – Vorbereitung zum Go-live**
- 5. Community Readiness des Marktes**

- 1. Einleitung**
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
3. Testphasen – Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-live
5. Community Readiness des Marktes

- Der **EZB-Rat** hat **beschlossen, den Starttermin des ECMS** auf den **18. November 2024** zu verschieben.
- Damit folgt der **EZB-Rat** der Einschätzung des **Market Infrastructure Boards (MIB)**, dass die Nutzer mehr Zeit benötigen, um die **Tests der ECMS-Funktionen** in einer stabilen Umgebung abzuschließen.
- Die zusätzliche Zeit soll
 - ✓ **eine größere Systemstabilität und**
 - ✓ **die Betriebsbereitschaft der Nutzer gewährleisten**
 - ✓ sowie eine **reibungslose Migration** auf die neue Plattform erleichtern.

ECMS

Aktueller Projektplan

	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				
Beschreibung	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
ECMS Projektzeitraum	[Blue bar from Q1 2018 to Q3 2024]																																◆
Spezifikationsphase	[Blue bar from Q2 2018 to Q3 2019]																																
Entwicklungs- und interne Testphase	[Blue bar from Q3 2018 to Q3 2021]																																
Abnahmetestphase	[Blue bar from Q4 2021 to Q3 2022]																																
User Testphase	[Blue bar from Q4 2021 to Q3 2023]																																
Migrationsphase	[Blue bar from Q4 2023 to Q3 2024]																																
Go-live	[Blue bar from Q4 2024 to Q3 2025]																												◆				
Stabilisierungsphase	[Blue bar from Q4 2024 to Q3 2025]																																

Quelle: www.ecb.europa@eu

- User Testphase im 4. Quartal 2022 gestartet, beinhaltet die Kundentestphase inkl. Testvorbereitung
 - (Vor-)Migrationsphase ab 2. Quartal 2024 für CSDs / TPAs und Geschäftspartner
 - Go/No-go Entscheidung am 04. Oktober 2024
- Go-live als „**Big Bang**“ am **18. November 2024**

1. Einleitung
- 2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen**
3. Testphasen – Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-Live
5. Community Readiness des Marktes

Beschreibung	Beginn	Ende
Tests der Netzwerkanbindung zum ECMS (ECMS UTEST/PreProd) (Connectivity Tests) in Vorproduktionsumgebung <ul style="list-style-type: none"> • U2A-Nutzer können die ECMS GUI erreichen • A2A-Nutzer erhalten Antwort von dem ECMS 	17.04.2023	12.05.2023 verlängert bis 23.06.2023
Nutzertests in der Vorproduktionsumgebung (ECMS UTEST/PreProd) <ul style="list-style-type: none"> • Beinhalten Business-Day-Tests und auch Betriebstests • Bestehen aus allgemeinen Tests und einer Generalprobe für die Migration 	29.05.2023	06.09.2024
Netzwerkanbindung zum ECMS in der Produktionsumgebung (ECMS Produktion) (Connectivity Set-up)	01.04.2024	21.06.2024
Pre-Migration (ECMS Produktion)	05.08.2024	20.09.2024
Migration Weekend Preparation Week (ECMS Produktion)	04.11.2024	15.11.2024
Migration Weekend (ECMS Produktion) 1. Produktionstag ECMS	16.11.2024 18.11.2024	17.11.2024

Link zum von der EZB veröffentlichten Dokument: [ECMS info pack - user testing and migration](#)

Während der Migrationstests ist es **nicht** möglich, **ECMS Fachfunktionen zu testen**.


Migrationstest Nr. 9	29.04. bis 23.06.2024
Migrationstest Nr. 11	09.09. bis 22.09.2024
Migrationstest Nr. 12 (optional)	07.10. bis 20.10.2024

1. Einleitung
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
- 3. Testphasen – Durchführung der User Tests**
4. Migration – Vorbereitung zum Go-live
5. Community Readiness des Marktes

- **Gestaffelte Testaktivitäten**: Zuerst die NZBen, dann CSDs und TPAs, anschließend die Geschäftspartner.
- Kundentests in UTEST/PreProd
- Dauer der User Testphase: 10.07.2023 bis zum **06.09.2024**.
- Testaufwand zukünftiger **A2A-Nutzer** ist höher:
 - Nur harmonisierte, ISO 20022-konforme Nachrichten

ECMS Community Testing

Testphasen

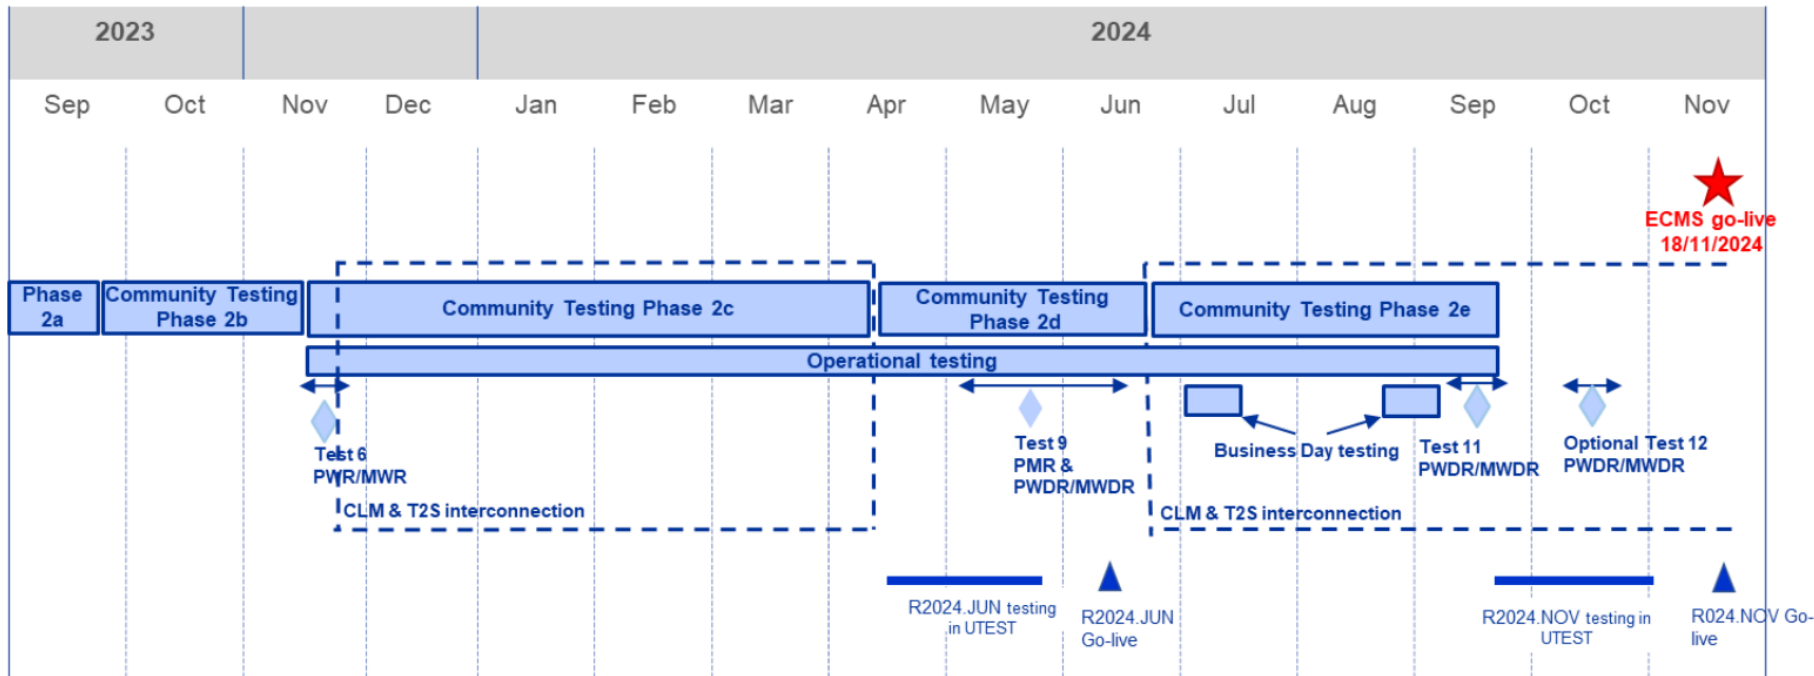

PW(D)R = Preparation Week (Dress) Rehearsal, **PMDR** = Pre-Migration Dress Rehearsal*,
PMR = Pre-Migration Rehearsal, **MWDR** = Migration Weekend Dress Rehearsal*,
MWR = Migration Weekend Rehearsal

*Dress Rehearsal: zeitlicher Ablauf analog zur Produktionsumgebung

CommunityTesting Phase 2c:

- **Zeitraum: 27.11.2023 bis 12.04.2024** (Verlängerung der Testphase um rund zwei Monate)
- Test der Funktionalitäten und Prozesse im ECMS **mit Anbindung an T2S und CLM**

Community Testing Phase 2d (neu):

- **Zeitraum: 15.04. bis 26.04.2024** (Zeitraum abzüglich Migrationstest)
- Test der Funktionalitäten und Prozesse im ECMS **ohne Anbindung an T2S und CLM**
- In dieser Phase wird ein **Simulator** zum Einsatz kommen

Community Testing Phase 2e (neu):

- **Zeitraum: 24.06. bis 06.09.2024**
- Test der Funktionalitäten und Prozesse im ECMS **mit Anbindung an T2S und CLM**

Business Day Testing:

- Slot 1: 01.07. – 11.07.2024 (außer Freitags)
- Slot 2: 26.08. – 05.09.2024 (außer Freitags)


Operational Testing:

- 20.11.2023 – 22.09.2024
- Das Operational Testing dient der **Validierung operationeller Verfahren.**

Beide Testphasen finden parallel zum „Kudentesting“ statt.

Hinweis:

Zu den Community Testing Phasen gehören auch die zuvor genannten **Migrationstests**.
Während der Migrationstests ist die **Durchführung von Fachtests im ECMS nicht möglich**.

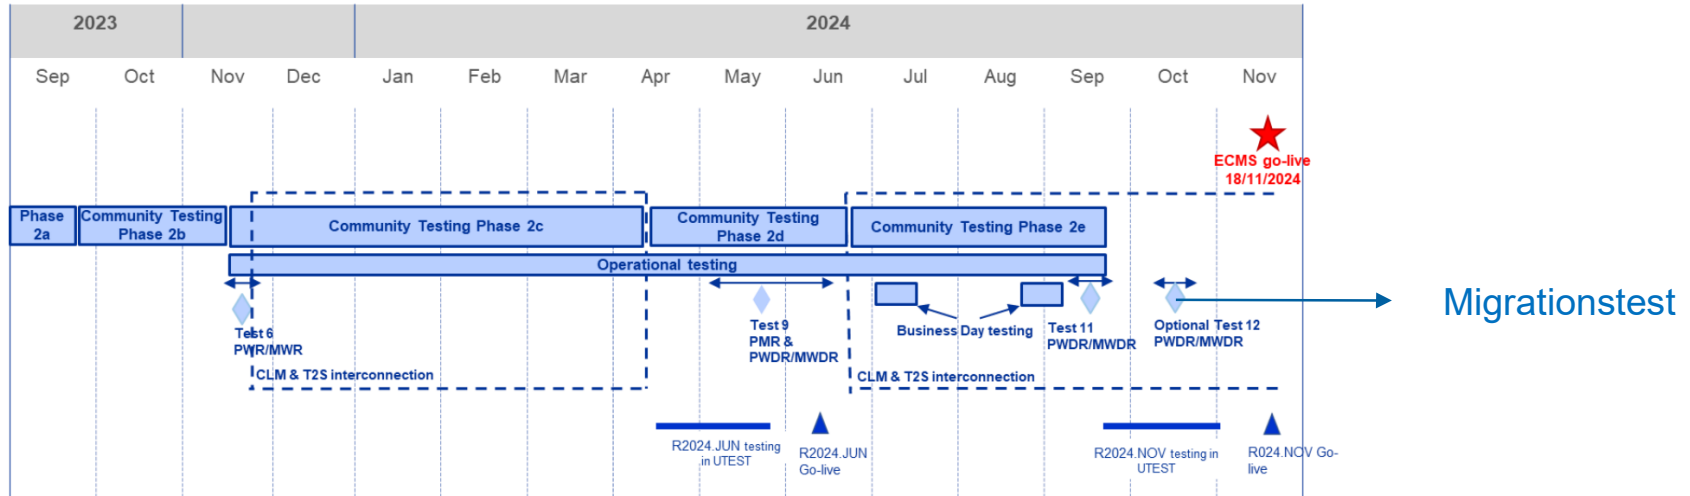

Während der Community Testing Phasen sind von der Bundesbank festgelegte **Testfälle** durchzuführen:

- **ECMS UT Fundamental Test Cases**

- eurosystemweit einheitliche Testfälle für Geschäftspartner

- **Bundesbank Testfälle**

- von der Bundesbank zusätzlich definierte Testfälle

Alle Testfälle sind **in sog. Testsets zusammengefasst**.

Folgende Testsets sind für die Geschäftspartner vorgesehen:

- Marketable Assets
- Global Credit and Collateral Position
- Cash as Collateral
- Corporate Actions
- Monetary Policy Operations
- Triparty
- Pool Position and Projection
- Statement and Reporting
- Non-Repudiation of Origin (NRO) mit Ascertia Go-Sign Client

- Nach Entscheidung des Eurosystems werden die **Funktionalitäten** im ECMS **schrittweise zum Test** für die Institute **freigegeben**.
- Alle Funktionen dürfen **erst nach Freigabe durch die Bundesbank** durch die Geschäftspartner getestet werden.
- Den aktuellen Stand der Freigaben finden Sie auf der Website der Bundesbank unter:

- [Test und Migration | Deutsche Bundesbank](#)

Downloads für Kundentests

📄 Freigaben der Deutschen Bundesbank für ECMS Kundentests
Version 2.0
08.12.2023 | 887 KB, PDF

ECMS Community Testing

Staggered Approach – Aktueller Stand der Freigaben

Fundamental Test Case ID	Funktion	Testfall	EZB-Freigabe	Bundesbank-Freigaben				Kommentar
				Gruppe A	Gruppe B	Gruppe C	Gruppe D	
Connectivity Tests								
	Connectivity	The connectivity to ECMS UZA & A2A [admi.005 message] is tested	ja	ja	ja	ja	ja	
	User Creation	The counterparty administrators may create counterparty users and check whether the users can login to ECMS	ja	ja	ja	ja	ja	
MARKETABLE ASSETS								
Domestic mobilisation/demobilisation of MA, Cross-Border Mobilisation/demobilisation of MA (CCBM), cancellation of mobilisation/demobilisation of MA								
Anmerkung: _CPTY1 bis _CPTY4: Pflichttestfälle für alle Geschäftspartner // _CTPY 10: Testfall nur bei aktueller oder geplanter Nutzung mit ECMS Go-Live relevant								
ECMS_TC_CPTY 1	Marketable asset mobilisation (domestic/CCBM)	Successful mobilisation of marketable asset	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2.2
ECMS_TC_CPTY 2	Cancellation of a marketable asset mobilisation (domestic/CCBM)	Successful cancellation of mobilisation of marketable asset	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2.2
ECMS_TC_CPTY 3	Marketable asset demobilisation (domestic/CCBM)	Successful demobilisation of marketable asset	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2.2
ECMS_TC_CPTY 4	Cancellation of a marketable asset demobilisation (domestic/CCBM)	Successful cancellation of a demobilisation of marketable asset	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2.2
ECMS_TC_CPTY 10	T2S relocation of collateral	Successful T2S relocation of collateral	nein	nein	nein	nein	nein	ECMS Testing Conditions, section 2.2.2
GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION								
Update of Maximum Credit Line value and Credit lines; Update of Credit freezing, Global credit position management, Margin call, Request Marginal Lending, Update of credit and collateral position due to the change of business date								
Anmerkung: _CPTY 11 und _CPTY 19: Pflichttestfälle für alle Geschäftspartner // _CTPY_12 nur bei aktueller oder geplanter Nutzung des Contingency-ECONSII-Pools relevant								
ECMS_TC_CPTY 11	Update maximum credit line value	Successful increase of the maximum value of the intraday credit line with increase of the credit line	ja	ja	ja	ja	ja	ECMS Testing Conditions, section 2.2.3
ECMS_TC_CPTY 19	Request Marginal Lending	Marginal lending request successfully processed.	nein	nein	nein	nein	nein	ECMS Testing Conditions, section 2.2.3
ECMS_TC_CPTY 12	Update a credit freezing	Update a Credit Freezing	ja	nein	nein	nein	nein	ECMS Testing Conditions, section 2.2.3
CASH AS COLLATERAL								
Cash Collateral mobilisation/ Cash Collateral demobilisation								
Anmerkung: Pflichttestfälle für alle Geschäftspartner								
ECMS_TC_CPTY 8	Cash collateral mobilisation	Successful mobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS after a margin call	ja	ja	nein	nein	ja	Tag 1: Unterdeckung wird durch die Bundesbank veranlasst. ECMS Testing Conditions, section 2.2.4
ECMS_TC_CPTY 9	Cash collateral demobilisation	Successful demobilisation of cash initiated by the counterparty or by ECMS as soon as there is sufficient collateral to cover the credit operation	ja	ja	nein	nein	ja	Tag 2: Bundesbank sorgt für den Collateral Überschuss. ECMS Testing Conditions, section 2.2.4
n/a		Update of credit and collateral position due to the change of business date	nein	nein	nein	nein	nein	

ECMS Community Testing

Hinweis zum Testing im 4-Augen-Prinzip

- Aktuell funktioniert das **4-Augen-Prinzip im ECMS nicht wie erwartet**. Aus diesem Grund werden die **Tests** vorerst **im 2-Augen-Prinzip** durchgeführt.
- Bitte legen Sie vorerst **keine weiteren User mit der Rolle „Validator“** (4-Augen-Prinzip) im ECMS an.
- Verwenden Sie stattdessen die Rolle **„Supervisor“** (2-Augen-Prinzip).
- Bei Neuanlage von Usern sind **immer die Rolle „Supervisor“ und eine Business Role zu vergeben**. Andernfalls können keine User angelegt werden.
- Sobald das 4-Augen-Prinzip funktioniert, werden wir Sie informieren.

Sollten während der Testfalldurchführung **Fehler** auftreten, ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Dokumentation des Fehlers im Incident-Template
 - Inklusive Screenshots
 - Das Template finden Sie auf der Internetseite der Bundesbank unter [ECMS Test und Migration](#)
2. Versand einer E-Mail mit dem Incident-Template an ecms-test@bundesbank.de

ECMS Community Testing

Unterstützung der Bundesbank (1/3)

- Die Bundesbank wird die **innerhalb des zugeordneten Testzyklus testenden Institute unterstützen.**
- Die Unterstützung für die Banken, die **außerhalb ihres Testzyklus** testen, wird **eingeschränkt** sein und nach Best Effort erfolgen.

Testsupport durch die Deutsche Bundesbank je Kundentestgruppe und freigeberer Funktionalität v2.1

Stand 29.01.2024

Bitte beachten Sie, dass diese Übersicht eine Information über die Zeiten des garantierten, **besonderen Geschäftspartnersupports** für die **Gruppen A, B und C** bietet. Sie repräsentiert **nicht** den gesamten Testzeitraum.

		CTP2c End-to-End 14.12.2023 - 12.04.2024									
Woche		50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
Start		14.12.	18.12.	27.12.	02.01.	08.01.	15.01.	22.01.	29.01.	05.02.	12.02.
Ende		15.12.	22.12.	29.12.	05.01.	12.01.	19.01.	26.01.	02.02.	09.02.	16.02.
Testset Kundengruppe	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung	Wertpapier- belieferung
	A B C D*	A B C D*			A B C D*	A B C D*	A B C D*	A B C D*		**	**
	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine	Maximum CreditLine

ECMS Community Testing

Unterstützung der Bundesbank (2/3)

Kontaktmöglichkeiten

E-Mail:

ecms-test@bundesbank.de

Hotline:

069 2388-1315

Erreichbar von Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr.

ECMS Community Testing

Unterstützung der Bundesbank (3/3)

Sollte das **ECMS für Tests nicht zur Verfügung** stehen, werden wir Sie hierüber umgehend per **E-Mail** informieren.

Mögliche Gründe:

- Migrationstests
- Außerplanmäßige Software Deployments

Sobald die Testumgebung wieder erreichbar ist, erhalten Sie ebenfalls eine **E-Mail** als Information von uns.

Das **Testergebnis** ist der Bundesbank durch **Beantwortung einer Online-Umfrage** mitzuteilen.


- Es handelt sich um eine Umfrage, die erst zum Ende der Kundentests geschlossen wird.
- Nach Freigabe neuer Funktionalitäten im ECMS werden in der Umfrage neue Felder zur Meldung der Testergebnisse freigeschaltet.
- Wir werden während der Kundentestphase zu gegebenen Zeitpunkten an die Umfrage erinnern.
- Ein **Nachweis der Testergebnisse** muss nicht an die Bundesbank gesendet werden.

Bei Fragen oder Anmerkungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. Einleitung
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
3. Testphasen – Durchführung der User Tests
- 4. Migration – Vorbereitungen zum Go-live**
5. Community Readiness des Marktes

ECMS User Testing plan for Pre-Prod

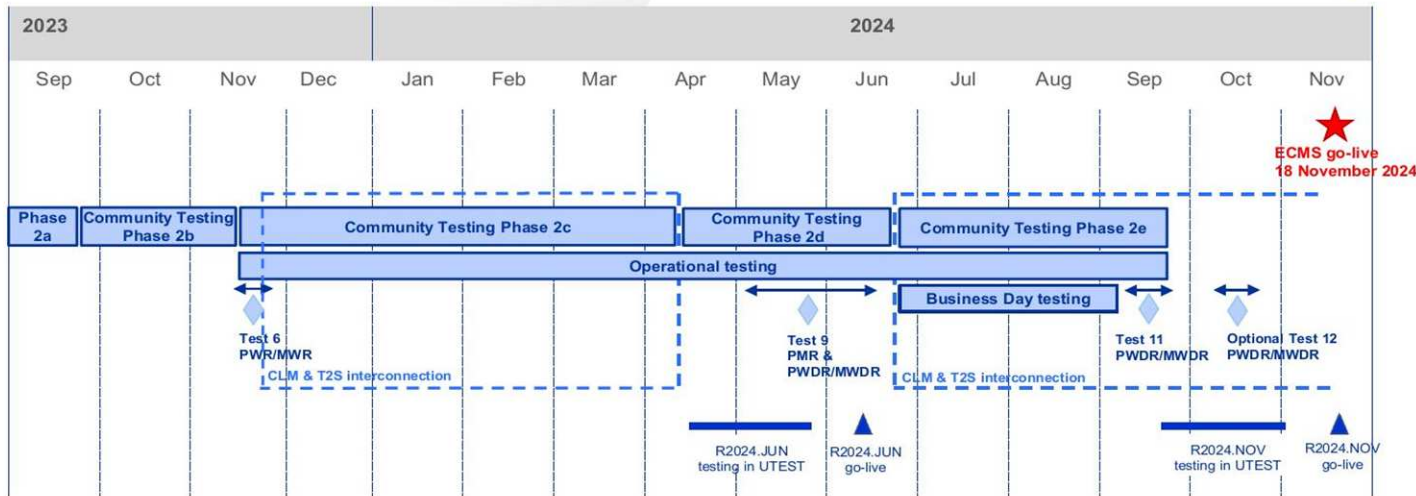

The duration of User Testing phases (Community testing phase 2, Business day and Operational testing) includes time needed to execute migration testing. The ECMS Pre-Prod environment remains available for testing after the end of CTP2e for elements which are not critical for the decision to go live.


Umgebung ECMS
UTEST/Pre-Prod

Test Nr.	Testart	Beteiligte Akteure	Startdatum	Enddatum
Test 9	PMR	NZBen Counterparties	02.05.2024 Nicht früher als 27.05.2024	07.06.2024 07.06.2024
	PWDR	NZBen, CSDs	10.06.2024	21.06.2024
	MWDR	NZBen, CSDs, TPAs	21.06.2024	23.06.2024
		Counterparties	23.06.2024	23.06.2024
Test 11	PWDR	NZBen, CSDs	09.09.2024	20.09.2024
	MWDR	NZBen, CSDs, TPAs	20.09.2024	22.09.2024
		Counterparties	22.09.2024	22.09.2024
Test 12 (optional)	PWDR	NZBen, CSDs	07.10.2024	18.10.2024
	MWDR	NZBen, CSDs, TPAs	18.10.2024	20.10.2024
		Counterparties	20.10.2024	20.10.2024

PWDR = Preparation Week Dress Rehearsal*, **PMDR** = Pre-Migration Dress Rehearsal*, **PMR** = Pre-Migration Rehearsal
MWDR = Migration Weekend Dress Rehearsal*, **MWR** = Migration Weekend Rehearsal

*Dress Rehearsal: zeitlicher Ablauf analog zur Produktionsumgebung

ECMS migration plan

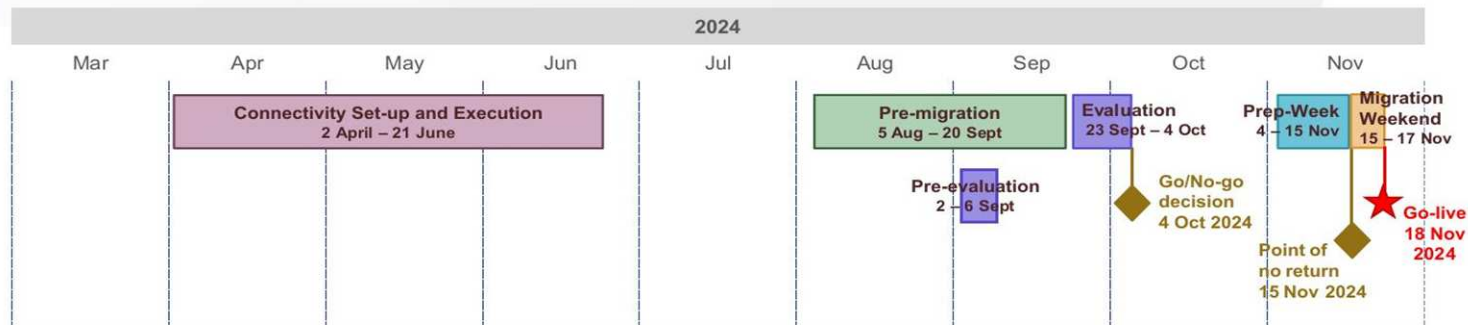


Connectivity Set-up and Execution for production is not considered a migration activity but is a pre-requisite for executing migration and for the go-live.

Pre-migration activities refer mostly to the set-up of reference data.

Evaluation phase is the phase in which the MIB will assess the go/no-go decision, based on prepared reports (starting in pre-evaluation).

To prepare for the Migration Weekend, some activities need to be performed before the actual start of the weekend, for example to actualise the database.

During the Migration Weekend all activities related to transactional data migration will be executed.

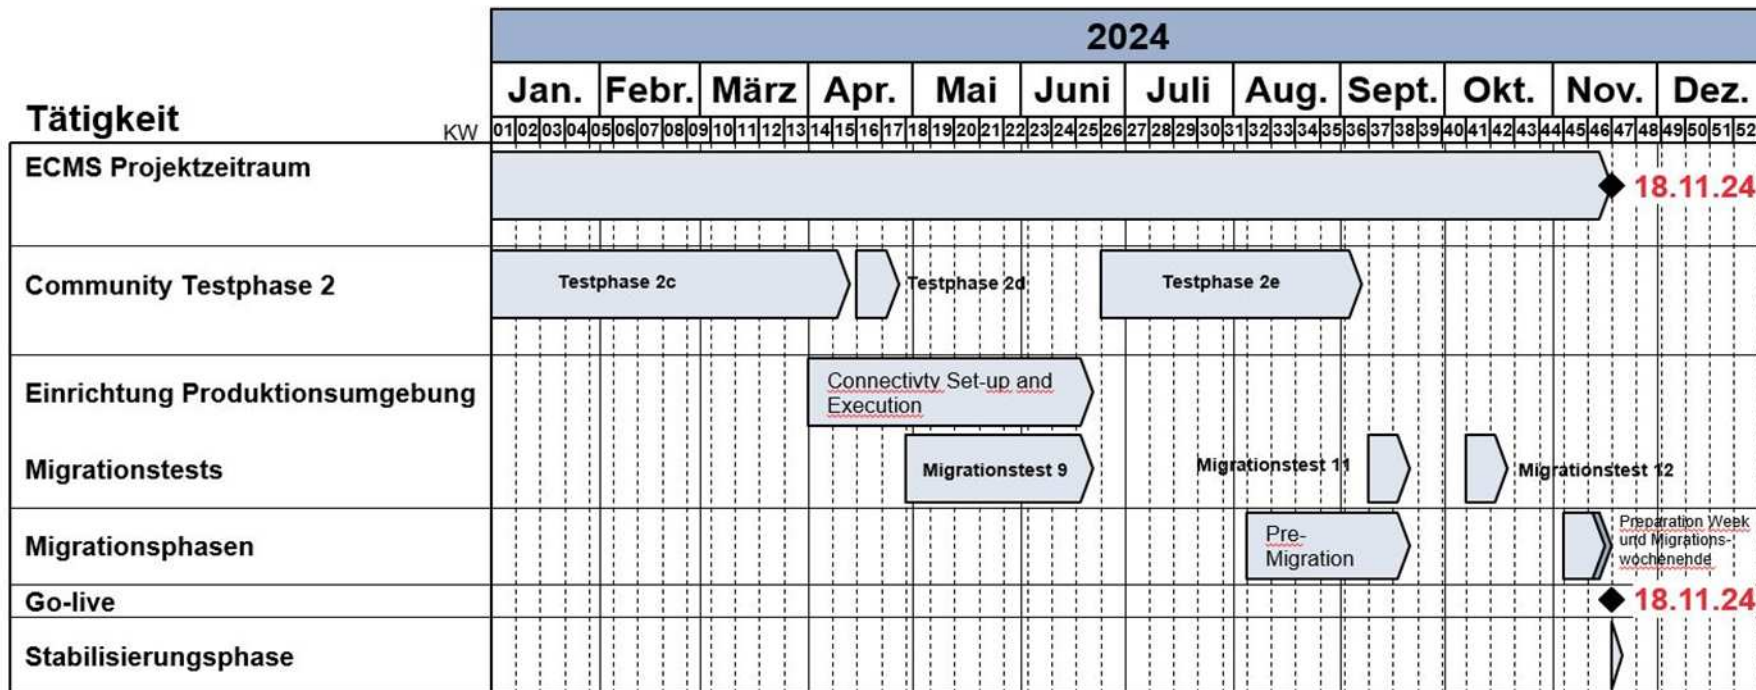

Quelle: Deutsche Bundesbank

„**Big Bang**“ Migration aller NZBen des Eurosystems im November 2024:

1. Produktionstag des ECMS: **18. November 2024**

Phasen der Migration:

1. Connectivity Set up und Execution inkl. Migration von Stammdaten Teil 1 sowie der Anlage von A2A-Usern sowie Benutzeradministratoren durch die Bundesbank
2. Pre-Migration-Phase: Migration der restlichen Stammdaten sowie Anlage von weiteren Benutzern
3. Migration Weekend: Migration der Bestände
4. Post Migration

- NZBen werden alle am **Freitag Tagesende existierenden Bestände** nach ECMS migrieren.
- **Lagerstellen (CSD-Konten)** bleiben **unverändert**. Mittels dem ECMS werden sie lediglich durch ein neues System verwaltet.
- Die **Produktionsumgebung wird zeitlich parallel zu den Kundentests in der UTEST/PreProd aufgebaut**.
- **Keine ausstehenden Transaktionen am Migrationswochenende:**
 - Ein- und Auslieferungen müssen bis Freitag bzw. bis zum noch bekanntzugebenden Termin abgeschlossen sein, ansonsten sind sie am folgenden Montag auszuführen.
 - Aktuell ist eine Beteiligung von allen Geschäftspartnern grundsätzlich nicht erforderlich.
- Die **Phasen der Migration 2 bis 4** sind im Wesentlichen eine **notenbankinterne Migration**. Mitwirkung der Geschäftspartner bei der Anlage von ECMS-Benutzern erforderlich sowie ggf. notwendig bei Abgleich der Stammdaten in der Pre-Migration-Phase. Umfangreichere Auswirkungen bestehen für CSDs und TPAs.

Connectivity Set up and Execution Phase

1. Vorbereitungen auf Kundenseite müssen zum Start der Phase abgeschlossen sein: Einrichtungen auf NSP-Ebene, vorliegendes Registrierungsformular für die Produktionsumgebung.
2. Bundesbank migriert die zur Connectivity erforderlichen Stammdaten und legt die in den Registrierungsformularen für die ECMS Produktion gemeldeten A2A- und U2A-Benutzer mit ihrem 1. DN*-Zertifikat an.
3. Sie dürfen in der Produktionsumgebung nur Aktivitäten ausführen, die Ihnen von der Bundesbank zugewiesen werden.
4. Ausführung der von der Bundesbank vorgegebenen Aktivitäten in der von der Bundesbank vorgegebenen Zeitfenstern: Start Connectivity voraussichtlich **ab Anfang Mai 2024 nach grünem Licht durch die Bundesbank, Durchführung Connectivity Tests (U2A, A2A) bis 31.05.2024. Wir bitten um zügige Umsetzung.**
5. Einrichtung 2. DN* bei den von der Bundesbank eingerichteten Benutzeradministratoren sowie A2A-Usern sofern gewünscht / erforderlich (siehe Folie 34).

*DN = distinguished name

One User multiple DN (Change Request 0084) Umsetzung mit ECMS Go-live:

- Aktuell sind in der ECMS-UTEST/PreProd alle User mit **einem einzigen DN** eingerichtet (U2A und A2A-User)
- Softwareanpassung zum CR im ECMS soll im März 2024 in die **Kundentestumgebung** ausgeliefert werden. Nach grünem Licht durch die Bundesbank müssen die Institute, die multiple DNs nutzen werden, diese im ECMS nachträglich selbsttätig erfassen. In **UTEST** ist dies voraussichtlich möglich in der Zeit **vom 01.04. bis 26.04.2024** (vor Migrationstest 9), während Migrationstest 9 ist eine Anpassung machbar, A2A aber nicht testbar. Nach Migrationstest 9 können weitere Anpassungen durchgeführt werden.
- **Produktionsumgebung:** analoge Vorgehensweise - Einrichtung der im Registrierungsformular genannten Admin-User mit einem DN durch die Bundesbank, Ergänzung weiterer DN durch die Institutsbenutzer selber. Dies ist möglich in der Zeit **ab Anfang Mai 2024 bis 01.08.2024**
- **Hinweis:** Bitte erst die Anpassung in UTEST (nahezu) abschließen, bevor User in ECMS-Prod um DN ergänzt werden.


Anstehende Aktivitäten für die Geschäftspartner	Zeitpunkt	Hinweis
Beantragung und Einrichtung von Benutzerzertifikaten ESMIG (inkl. DN)	Sofern noch nicht erledigt	Müssen vor dem 01.04.2024 eingerichtet sein und sind im Registrierungsformular anzugeben
Rücksendung Registrierungsformular inkl. der Angabe der User-DN (distinguished names) für ESMIG Produktion	Termin bereits abgelaufen	Bei Änderungen sind uns die Deltas schriftlich mitzuteilen (per Registrierungsformular an ecsmigration@bundesbank.de).
Einrichtung NSP für ECMS Produktion	Sofern noch nicht erledigt	
e-ordering CGU SWIFT oder NEXI	Sofern noch nicht erledigt	
Prüfung der Verbindung A2A und U2A	Sobald die Bundesbank darüber informiert	Wir bitten um zügige Durchführung der Connectivity –Tests.
Bestätigung an Bundesbank für Prüfung der Verbindung (A2A und U2A)	In der Zeit vom 06.05.2024 (bzw. nach grünem Licht durch Bundesbank) bis zum 31.05.2024. Durch Beantwortung der zugesandten elektronischen Umfrage	Bundesbank hat in der Zeit wöchentlich an die EZB den Connectivity Status zu berichten.

Anstehende Aktivitäten für Geschäftspartner	Zeitpunkt	Hinweis
Einrichtung von weiteren Institutsbenutzern/U2A inkl. DNs	Ab grünem Licht von der Bundesbank voraussichtlich 05.08.2024 bis 20.09.2024	Pre-Migration-Phase
Vorbereitungswoche vor dem Migrationswochenende	04.11.2024 bis 15.11.2024	Keine Aktivitäten für Geschäftspartner
Migrationswochenende	16.11.2024 bis 17.11.2024	Aktivitäten am Wochenende nur für einzelne Geschäftspartner
1. Produktionstag ECMS	18.11.2024	
Post-Migration	18.11.2024 bis 22.11.2024	

Bei Fragen oder Anmerkungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. Einleitung
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
3. Testphasen – Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-live
5. **Community Readiness des Marktes**

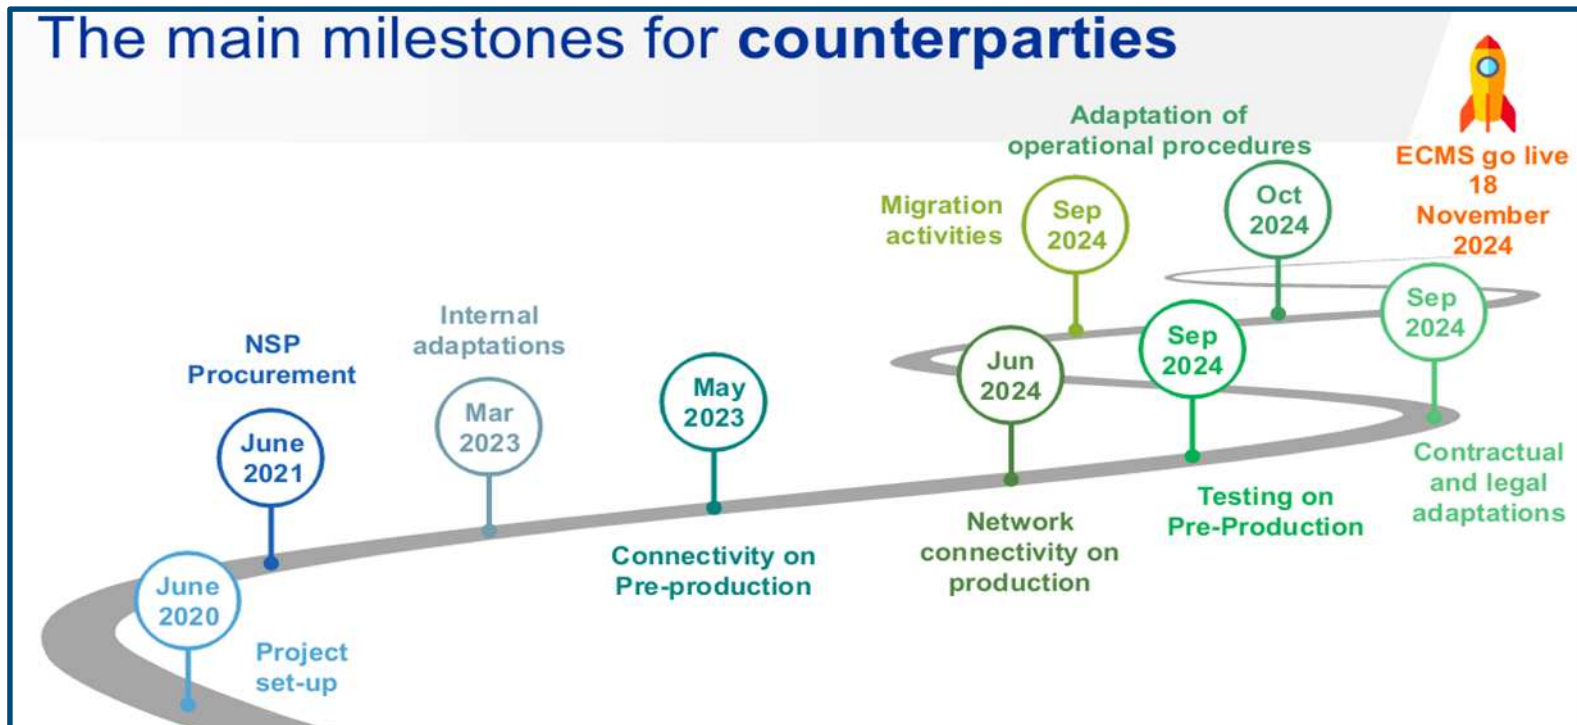

Quelle: www.ecb.europa@eu

Spezifische Umfrage der Bundesbank:

- Am **29. Januar 2024** erfolgte der Versand einer **Community Readiness Umfrage zu ECMS** an unsere Ansprechpersonen (RMAs* / CMAs*)
- Fokus der Umfrage liegt auf **spezifischen Fragen** der **Bundesbank**.
- Rückmeldefrist ist Montag, der **26. Februar 2024**.

Nächste Community Readiness Umfragen der EZB:

- Im **Juni** und **September dieses Jahres** sind die nächsten Umfragen zum Vorbereitungsstand der geldpolitischen Geschäftspartner im Hinblick **auf die Betriebsaufnahme des ECMS** geplant.
- Die Abfrage der Meilensteine **zu Test und Migration** werden zukünftig nicht mehr im Rahmen des Community Readiness Monitorings abgefragt, sondern nur noch über die dafür **etablierten Umfragen** zum Teststatus und zu den Migrationsvorbereitungen.

Themenschwerpunkte der aktuellen Umfrage:

- ✓ Einschätzung zum Projektfortschritt mit Blick auf die **Inbetriebnahme des ECMS im November 2024**
- ✓ Angaben zur **Anbindung an das ECMS**
- ✓ Relevanz zur **Nutzung des CR 084** (ECMS-Nutzer mit mehreren (DN* = Zertifikaten))
- ✓ **Ascertia Go-Sign Client in der Version 6.9.0.20**
- ✓ Angabe, ob **Meilensteine aus den vorherigen Berichtszyklen erfüllt sind.**

*DN = distinguished name

Bisher ist es im **ECMS** technisch nicht möglich, einen ECMS Nutzer (= User) mit **mehreren (DNs = Zertifikaten)** zu verknüpfen.

Dies hat zur Folge, dass im ECMS nicht mehrere Zugangskanäle adressiert werden können, sodass bei Nichtverfügbarkeit eines Zugangskanals ein weiterer als Ausfalllösung eingesetzt werden kann.

Beispiel für U2A-Anbindung:

- Für einen ECMS Nutzer besteht **ein DN** für die **Produktions-SAG*** und **eine weiterer DN** für die **Ausfall-SAG***.
 - Das Kreditinstitut müsste pro **User** entscheiden, welche **DN im ECMS hinterlegt werden** soll. Je nachdem, welcher **Zugangskanal (Produktions-SAG / Ausfall-SAG)** dann ggf. nicht zur Verfügung steht, könnte es sein, dass der User das ECMS nicht erreichen kann.
- Der Change Request (CR) Nr. 0084 behebt nun diese Restriktion im ECMS.
- Die Umsetzung dieses CR ist mit Go-live beschlossen. **Somit wird** eine Verknüpfung mit mehreren DNs zu Beginn der Testphase **im Frühjahr 2024** in der ECMS-Testumgebung UTEST umgesetzt.

Digitale Signatur (NRO) für kritische Transaktionen

- Um die Nichtabstreitbarkeit der Herkunft (Non-Repudiation of Origin / NRO) für **kritische Transaktionen** zu gewährleisten, wird für bestimmte Screens die Verwendung einer digitalen Signatur eingeführt.
- Dies bedeutet, dass der Benutzer aufgefordert wird, einen **PIN-Code** für die Unterschrift einzugeben, wenn eine Anweisung („Instruction“) eingeleitet wird. Mit der Eingabe der PIN fügt das ECMS der vom Benutzer eingegebenen Anweisung eine **digitale Signatur** hinzu.
- Benutzer müssen den **Ascertia Go-Sign Client in der Version 6.9.0.20** auf ihrem Arbeitsplatz installiert haben, um das ECMS über U2A für die Screens, die einer digitalen Signatur unterliegen, nutzen zu können.
- Ascertia ist die einheitliche **NRO-Lösung für alle TARGET-Dienste**. Es wird also dieselbe Version des Ascertia Go-Sign Desktop Clients für die verschiedenen TARGET-Dienste verwendet.
- Zur **reibungslosen Teilnahme** an den ECMS-Tests empfehlen wir eine **zeitnahe Installation der Software**. Der **Download ist** für alle Benutzer möglich, die zum Zugriff auf das ESMIG-Portal berechtigt sind.
- Weitere Informationen zum Download der Software können Sie dem **„ECMS Leitfaden für die Kundentestphase“** entnehmen: [Eurosystem Collateral Management System \(ECMS\): Leitfaden für die Kundentestphase \(bundesbank.de\)](https://www.bundesbank.de/pressenotizen/2024/01/24-ecms-leitfaden-fur-die-kundentestphase).

– Die Bundesbank bietet **virtuelle Fachschulungen** zu den Themen „**Corporate Actions**“ und „**Reporting**“ in **Q1 / Q2 2024** an.

- Termine für ECMS Fachschulung „**Corporate Actions**“

29. Februar 10:00 bis 12:00 Uhr

07. März 10:00 bis 12:00 Uhr

- Nähere Informationen hierzu werden zeitnah an die Geschäftspartner versendet.

– Das „**ECMS Kundenforum User Testing**“ hat sich etabliert.

- Ziel: Austausch der Geschäftspartner zu testrelevanten Fragestellungen.
- Die Bundesbank stellt eine Austauschmöglichkeit über die Plattform „**WebEx**“ bereit.
- Die **virtuellen Veranstaltungen** finden am **zweiten Montag im Monat statt**.

- Veröffentlichung von **Begleitmaterialien zur Unterstützung der Tests: [Test und Migration | Deutsche Bundesbank](#)** (unter der Rubrik „Downloads für Begleitmaterial“ am Ende der Seite)
- **Schulungsunterlagen der Bundesbank** zu verschiedenen Funktionen des ECMS: [Teilnehmerinformationen | Deutsche Bundesbank](#) (unter der Rubrik „Schulungsunterlagen“ am Ende der Seite)
- Neuauflage des „**ECMS Leitfaden für Geschäftspartner**“ für die Produktionsumgebung des ECMS (gültig ab 18.11.2024)
- Laufende Aktualisierung der [Freigaben der Deutschen Bundesbank für ECMS Kundentests](#)

Q1 2024		Q2 2024		Q3 2024		Q4 2024	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Strategie for ECMS Migration and Testing ◆ ECMS User Testing Terms of Reference PreProd ◆ ECMS User Testing Fundamental Test Cases 				<ul style="list-style-type: none"> ◆ ECMS UHB for counterparties 		
Sofern das Dokument aktualisiert wurde	{	Explainer on business configurations	◆		Go-live version		
		Catalogue of Messages	◆		Go-live version		
		Business Rules in ECMS	◆		Go-live version		
		Status Codes in the ECMS	◆		Go-live version		

Quelle: www.ecb.europa@eu

Öffentliche Bundesbank-Informationen (in Deutsch & Englisch)

- Einführungsseite „ECMS Eurosystem Collateral Management System“
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system>
- Sammlung von 40+ BBk- und EZB-Publikationen in fünf unterschiedlichen Bereichen u. a. [ECMS User Handbook for Counterparties UHB V1.1](#)
- Teilnehmerinformationen (Virtuelle BBk-Informationsveranstaltungen)
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/teilnehmerinformationen>
- Test und Migration (EZB-Infos)
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration>
- [Dokumentation & FAQs \(Funktionale / Technische / Weiterführende EZB / FAQs\)](#)
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms>
- [Harmonisierungsinitiativen](#) und [ECMS Community Readiness Monitoring](#).

Weiterführende Informationen der EZB

- www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.



Kontakt

Allgemeine Fragen zu ECMS

☎ 069 9566 37030

Montag bis Freitag:
09:00 bis 15:00 Uhr

E-Mail: ECMS@bundesbank.de

Kontakt

Fragen zum ECMS Community
Readiness

☎ 069 2388 2399

E-Mail: ECMS-readiness@bundesbank.de

Kontakt

Fragen zu ECMS und Migration
Produktions- und Testbetrieb

☎ 069 2388 1315 (Hotline)

Montag bis Freitag:
13:00 bis 16:00 Uhr

E-Mail: ECMS-test@bundesbank.de

E-Mail: ECMS-migration@bundesbank.de
