

Herzlich Willkommen zur

ECMS Info Session

Bitte haben Sie noch einen Moment
Geduld.

Die Veranstaltung startet in Kürze.




- 1. Einleitung**
- 2. Zeitplanung und wichtige Meilensteine**
- 3. Testphasen – Durchführung der User Tests**
- 4. Migration – Vorbereitung zum Go-live**
- 5. Weiterführende Informationen**

- 1. Einleitung**
2. Zeitplanung und wichtige Meilensteine
3. Testphasen – Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-live
5. Weiterführende Informationen

- Der **EZB-Rat** hat **beschlossen, den Starttermin des ECMS** auf den **16. Juni 2025** zu verschieben.
- Diese Entscheidung wurde vom Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) getroffen, nachdem das Market Infrastructure Board (MIB) zur Einschätzung kam, dass trotz des guten Testfortschritts in den letzten Monaten zusätzliche Zeit benötigt wird, um
 - ✓ eine **ausreichende Systemstabilität** zu gewährleisten,
 - ✓ die **Tests der ECMS-Funktionen** abzuschließen
 - ✓ sowie eine **reibungslose Migration** auf die neue Plattform sicherzustellen.
- Weitere Informationen zur Verschiebung des ECMS Go-live können der Bekanntgabe der EZB [Eurosystem collateral management system to launch on 16 June 2025 \(europa.eu\)](https://www.europa.eu/press-communications/infobox/press-conferences/2024/11/14/111424) entnommen werden.


1. Einleitung
- 2. Zeitplanung und wichtige Meilensteine**
3. Testphasen – Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-live
5. Weiterführende Informationen

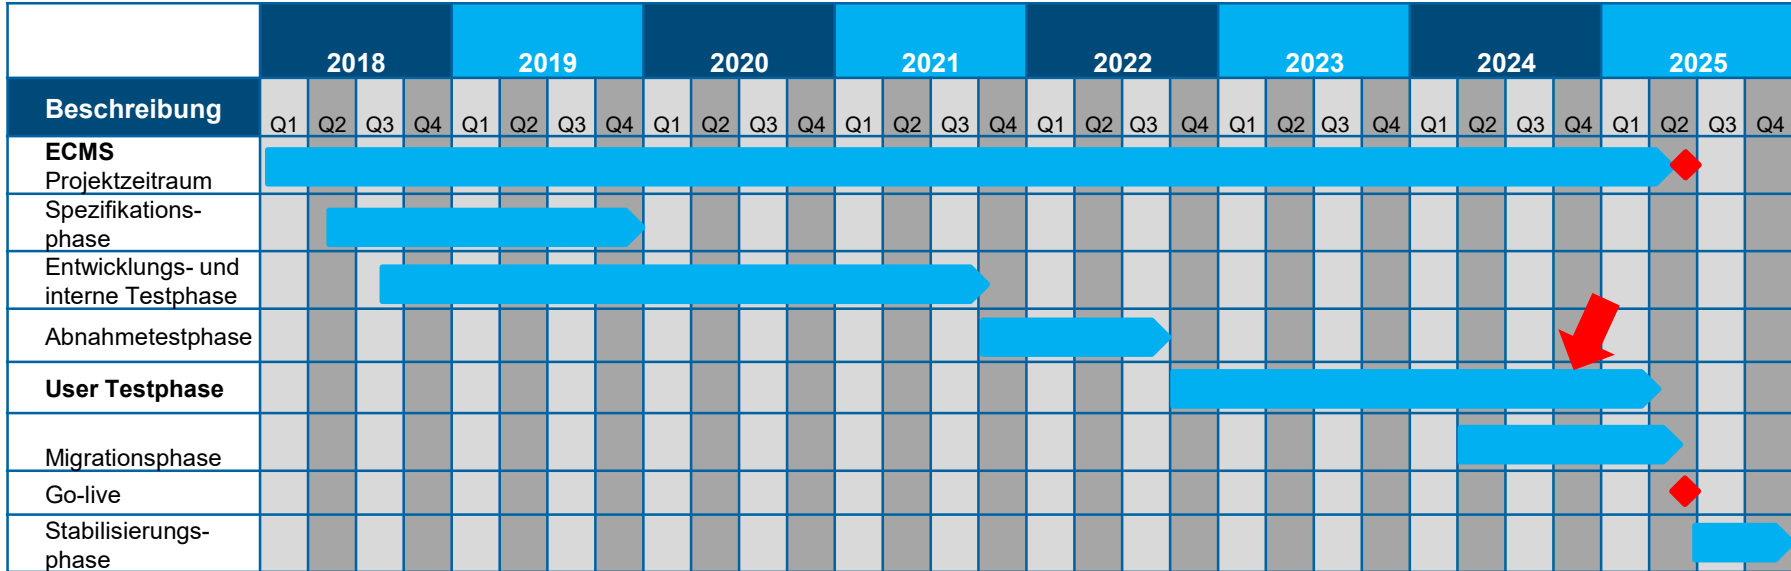

Quelle: www.ecb.europa.eu

→ **Go/No-Go Entscheidung** am 05. Mai 2025

→ Go-live als „**Big Bang**“ am **16. Juni 2025**

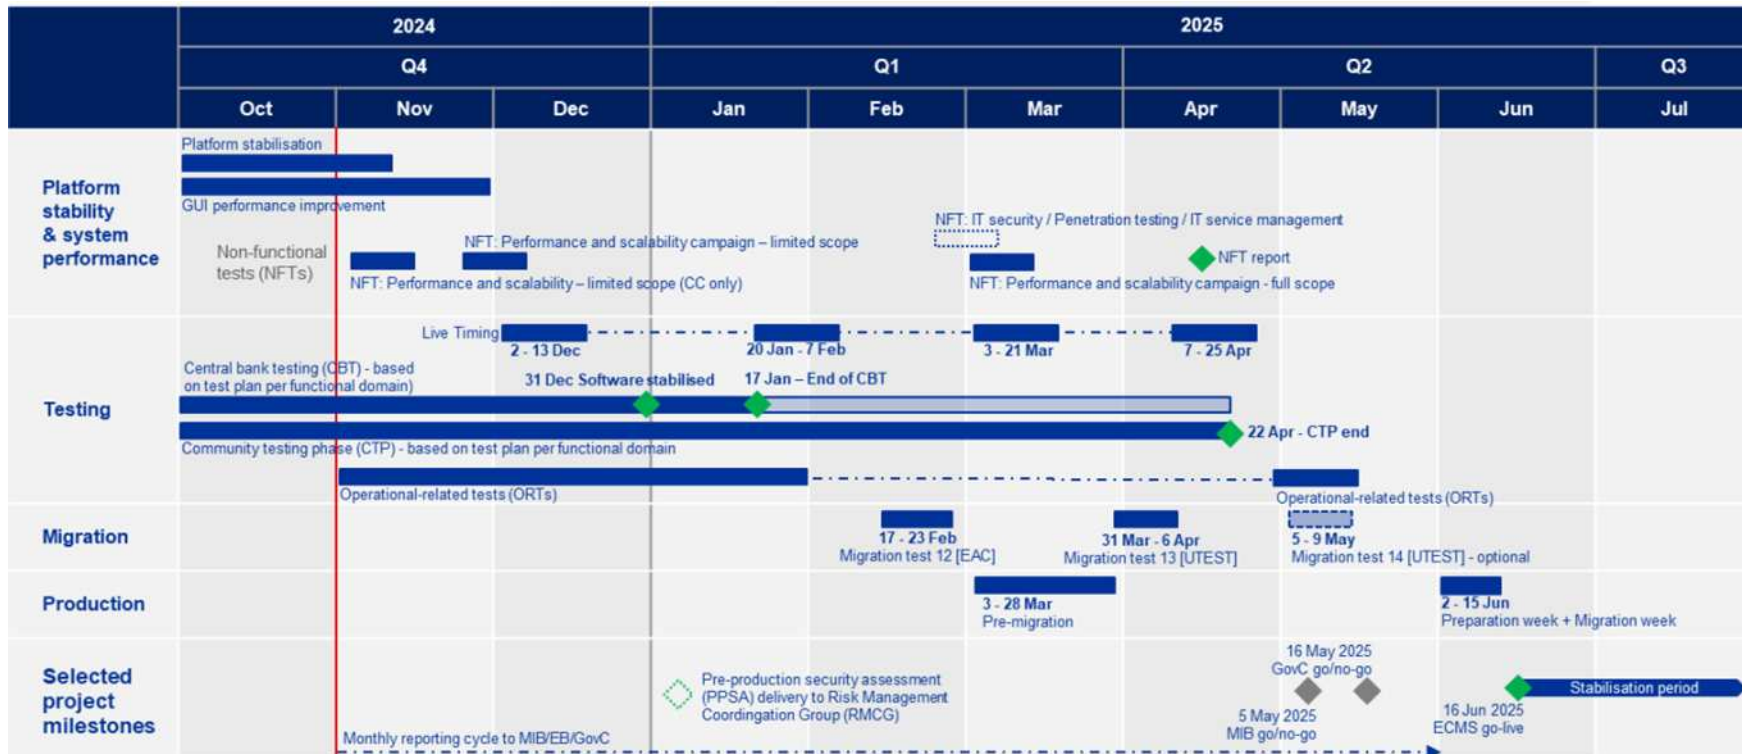

Quelle: https://www.ecb.europa.eu/press/intro/events/shared/pdf/fs25/2024-11-20_ECMS_timeline_milestones.pdf

ECMS


Go/No-Go Kriterien

Das Market Infrastructure Board (MIB) der EZB überprüft den Status des ECMS anhand von **Go/No-Go Kriterien**:




Quelle: https://www.ecb.europa.eu/press/intro/events/shared/pdf/fs25/2024-11-20_ECMS_timeline_milestones.pdf


- Zur Beurteilung der **Betriebsbereitschaft** der geldpolitischen Geschäftspartner des **deutschen Marktes** mit Blick auf die Betriebsaufnahme des ECMS dienen die Daten aus den **Kundentestabfragen**.
- Status der **geldpolitischen Geschäftspartner** zum 1. November 2024:



CMA*



RMA*



*Regularly Monitored Actors (RMAs)

*Closely Monitored Actors (CMAs)


- Die letzte Umfrage **zum Vorbereitungsstand der Geschäftspartner** fand im **September 2024** statt.
- Eine weitere Umfrage zum Vorbereitungsstand der geldpolitischen Geschäftspartner im Hinblick **auf die Betriebsaufnahme des ECMS am 16. Juni 2025** ist aktuell nicht geplant.
- Die Abfrage der Meilensteine **zu Test und Migration** werden nur noch über die dafür **etablierten Umfragen** zum Teststatus und zu den Migrationsvorbereitungen abgefragt.

Meilensteine bis zum Go-live des ECMS


Abschluss der
Vorbereitung auf die
Migration
30. März



Abschluss der
Anpassung der
Betriebsabläufe
4. April



Ende der Nutzertests
in der
UTEST / PreProd
22. April



Go/No-go
Entscheidung
5. Mai



16. Juni
2025
Go-live




Deutsche Bundesbank

Bei Fragen oder Anmerkungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. Einleitung
2. Zeitplanung und wichtige Meilensteine
- 3. Testphasen – Durchführung der User Tests**
4. Migration – Vorbereitung zum Go-live
5. Weiterführende Informationen

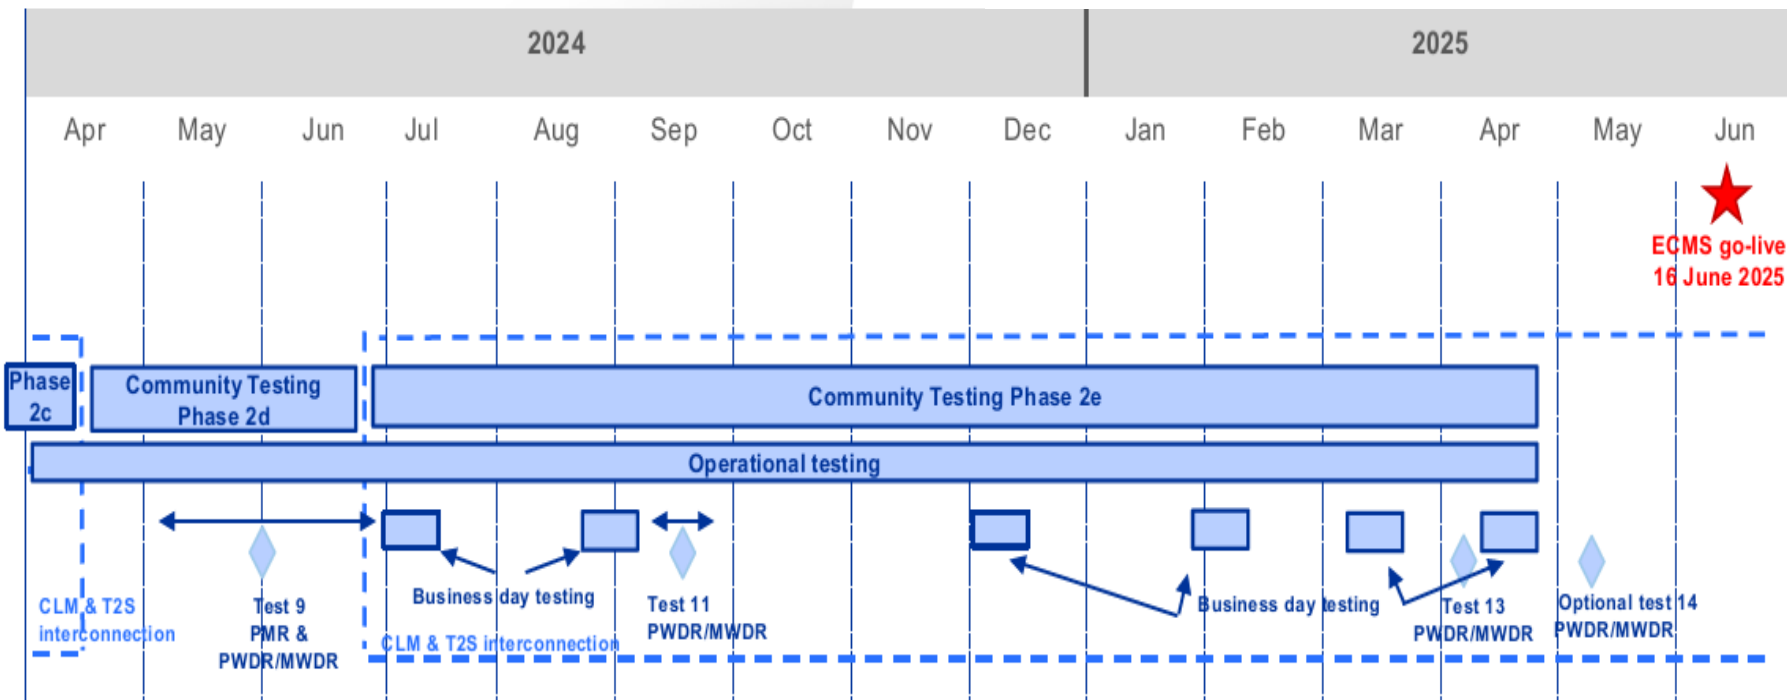

Die aktuelle **Community Testphase CTP2e** wurde im Rahmen der Neuplanung **bis einschließlich 22.04.2025** verlängert.

- **CLM** und **T2S** sind **uneingeschränkt verfügbar**.
- Während des Migrationstest Nr. 13 wird die UTEST für den Test von Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

- Folgende Zeiträume sind für das **Business Day Testing (Live Timing)** vorgesehen:

Phase	Zeitraum
1	25.11.2024 - 06.12.2024
2	20.01.2025 - 07.02.2025
3	03.03.2025 - 21.03.2025
4	07.04.2025 - 25.04.2025


- Beim Business Day Testing handelt es sich um eine Phase, die Tests mit einem besonderen **Fokus auf den Produktionszeitplan** (Tages- und Nachtprozesse) ermöglichen.

Funktionalität	Freigabe / Planung	Anmerkungen
Corporate Actions	Verpflichtende Testfälle 25 - 30 im April 2025 (Wiederholung, bereits im Juli 2024 abgeschlossen)	Ereignis mit Wahlmöglichkeit auf freiwilliger Basis im Dezember 2024 (Interessenbekundung notwendig)
Triparty	Testkampagne für Q1 2025 geplant	
4-Augen-Prinzip	✓	
NRO (Non Repudiation of Origin / Ascertia Go-Sign-Desktop)	✓	Aktiviert für <ul style="list-style-type: none"> • Marginal Lending on Request • Corporate Action Instructions • Credit Claims (nicht relevant für DE community)
Redaktionell: Billing	✓	Kein To-Do für Geschäftspartner. Bei Interesse kann Verarbeitung in BILL Common Component (T2) eingesehen werden

Auf der Internetseite der Bundesbank finden Sie unter [ECMS Test und Migration](#) verschiedene **Dokumente zur Unterstützung der Testdurchführung**:


- Die Dokumente werden laufend aktualisiert.
- Es wird empfohlen, die Dokumente bei der Testdurchführung heranzuziehen.


Downloads für Kundentests


 **Freigaben der Deutschen Bundesbank für ECMS Kundentests**
Version 3.2
08.11.2024 | 129 KB, PDF

 **Incident Ticket Template**
27.09.2023 | 28 KB, DOCX

Downloads für Begleitmaterial

 **Non-Repudiation of Origin (NRO)**
Version 1.0
30.07.2024 | 317 KB, PDF

 **Triparty: U2A - Testgrundsätze und Ausfüllhilfen für ECMS**
Version 2.0
20.08.2024 | 750 KB, PDF

 **Useranlage und -verwaltung in ECMS**
10.07.2024 | 680 KB, PDF

Sollten während der Testfalldurchführung **Fehler** auftreten, ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Dokumentation des Fehlers im Incident-Template
 - Inklusive Screenshots
 - Das Template finden Sie auf der Internetseite der Bundesbank unter: [ECMS Test und Migration](#).
2. Versand einer E-Mail mit dem Incident-Template an ecms-test@bundesbank.de.

Das **Testergebnis** ist der Bundesbank durch **Beantwortung einer Online-Umfrage** mitzuteilen.

- Es handelt sich um eine Umfrage, die erst **zum Ende der Kundentests geschlossen wird**.
- Wir werden während der Kundentestphase zu gegebenen Zeitpunkten an die **Umfrage erinnern**.
- Beachten Sie, dass die Umfrage **nur an eine E-Mail Adresse** gesendet werden kann.
- Ein **Nachweis der Testergebnisse** muss nicht an die Bundesbank gesendet werden.

Aktuelle Abfrage zum Testfortschritt

Frage 1: Bitte bewerten Sie den aktuellen Fortschritt für den Testcase ECMS_TC_CPTY 1 Marketable asset mobilisation (domestic und/oder CCBM):

Wurde erfolgreich getestet

Test ist fehlgeschlagen

Wurde noch nicht getestet

Frage 2: Bitte bewerten Sie den aktuellen Fortschritt für den Testcase ECMS_TC_CPTY 2 Cancellation of a marketable asset mobilisation (domestic und/oder CCBM):

Wurde erfolgreich getestet

Test ist fehlgeschlagen

Wurde noch nicht getestet

Frage 3: Bitte bewerten Sie den aktuellen Fortschritt für den Testcase ECMS_TC_CPTY 3 Marketable asset demobilisation (domestic und/oder CCBM):

Wurde erfolgreich getestet

Test ist fehlgeschlagen


Wurde noch nicht getestet

Bei Fragen oder Anmerkungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. Einleitung
2. Zeitplanung und wichtige Meilensteine
3. Testphasen – Durchführung der User Tests
- 4. Migration – Vorbereitung zum Go-live**
5. Weiterführende Informationen

Revised project timeline

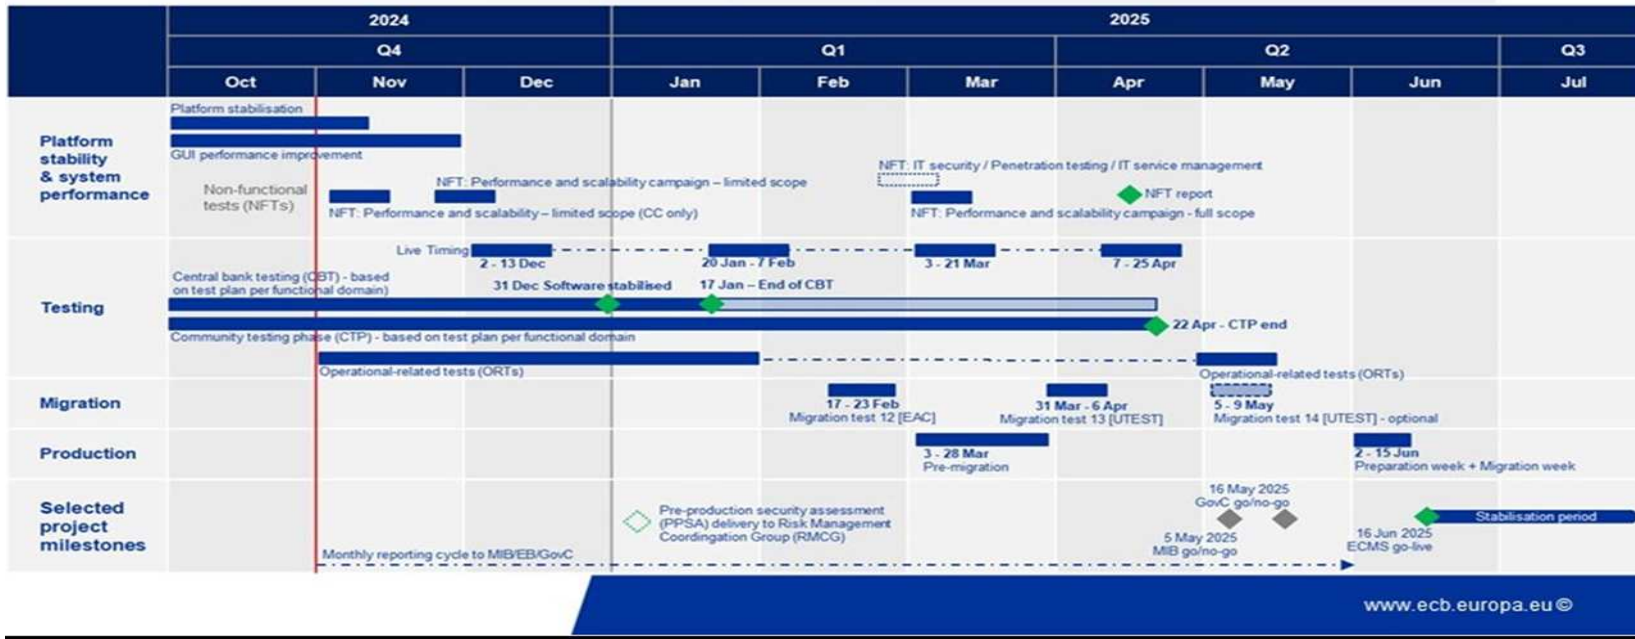

1. Migrationstests

- In 2024 wurden zwei Migrationstests unter **produktionsnahen Bedingungen** des **Migrationswochenendes in der Kundentestumgebung** durchgeführt (Migrationstest Nr. 9 und Migrationstest Nr. 11).
- Es wurden **Sicherheitenbestände** migriert.
- Migrationstest Nr. 11 zeigte **Verbesserungen** gegenüber den Ergebnissen des Migrationstests Nr. 9 und war erfolgreich.

2. Produktionsumgebung

- Die **Pre-Migration** wurde von Mai bis September 2024 durchgeführt.
- Es erfolgte die **Anlage der Stammdaten und Benutzer**, die Durchführung von **Connectivity Tests** sowie die Durchführung von **Systemkonfigurationen**.
- Die Produktionsumgebung ist ab dem 26.09.2024 für den **Zugriff für die Geschäftspartner gesperrt**.

1. Migrationstests

- In der Kundentestumgebung wird im **April 2025** der **Migrationstest Nr. 13** durchgeführt. Der **Migrationstest Nr. 14** ist optional (wird ESCB-weit ggf. aktiviert).
- Während der Migrationstests sind **keine Tests von Fachfunktionen in ECMS UTEST/Pre-Prod** möglich, da die Umgebung ausschließlich für Migrationsaktivitäten gesperrt ist.


Test Nr.	Teststart	Beteiligte Akteure	Startdatum	Enddatum
Test 13	PWDR	NZBen, CSDs, TPAs	31.03.2025	04.04.2025
	MWDR	NZBen, CSDs, TPAs, Geschäftspartner (sofern bilateral vereinbart)	04.04.2025	06.04.2025
		Geschäftspartner	06.04.2025	06.04.2025
Test 14 (optional)	PWDR	NZBen, CSDs, TPAs	05.05.2025	09.05.2025
	MWDR	NZBen, CSDs, TPAs, Geschäftspartner (sofern bilateral vereinbart)	09.05.2025	11.05.2025
		Geschäftspartner	11.05.2025	11.05.2025

PWDR = Preparation Week Dress Rehearsal*, **MWDR** = Migration Weekend Dress Rehearsal*

*Dress Rehearsal: zeitlicher Ablauf analog zur Produktionsumgebung

2. Produktionsumgebung

- Das **Geschäftsdatum** im ECMS wurde auf den **02. Juni 2025** geändert (Startdatum der Preparation Week).
- Für die Durchführung der noch ausstehenden **Pre-Migration-Aktivitäten** wird die **Produktionsumgebung** für
 - Geschäftspartner ab dem **3. März bis 28. März 2025** temporär geöffnet.
- Ziel: Abschluss der noch **ausstehenden Connectivity-Tests** sowie die **Änderung von Benutzern** sowie die **Anlage von weiteren Benutzern** durch die Geschäftspartner.
- Hinweis: es ist nur der **Zugriff auf ECMS in U2A** möglich, wegen ggf. noch ausstehender A2A-Aktivitäten bitten wir um **bilaterale Kontaktaufnahme** per Mail an ecms-migration@bundesbank.de.

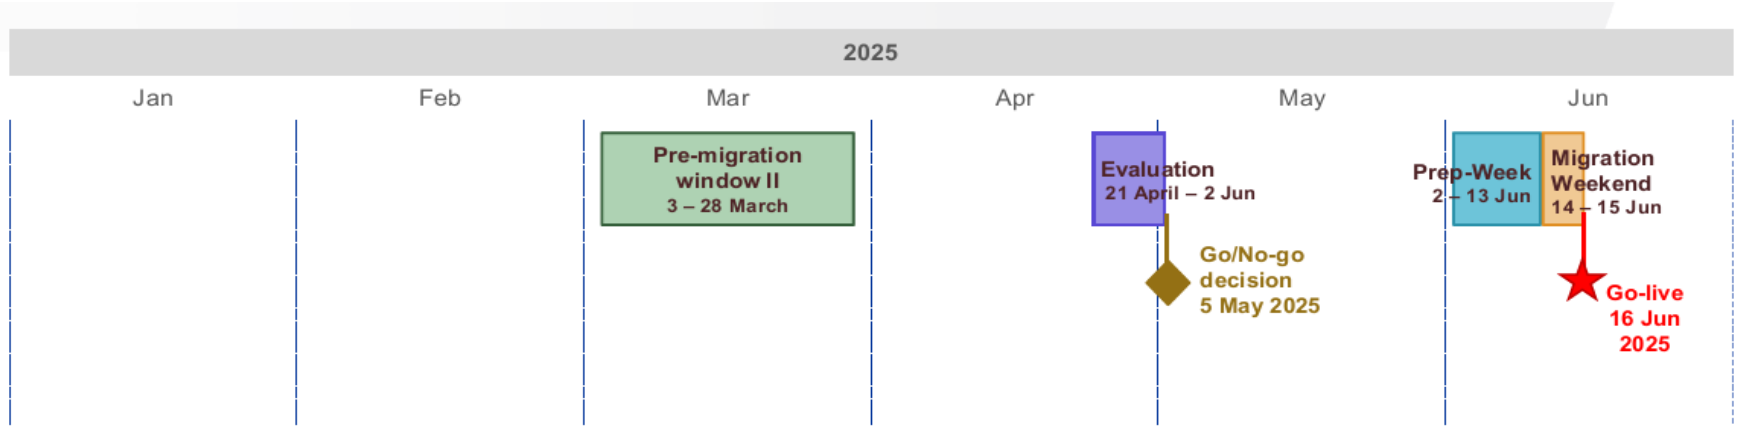

Pre-migration activities refer mostly to the set-up of reference data.

Evaluation phase is the phase in which the MIB will assess the go/no-go decision, based on prepared reports.

To prepare for the Migration Weekend, some activities need to be performed before the actual start of the weekend, for example to actualise the database.

During the Migration Weekend all activities related to transactional data migration will be executed.

Quelle: [ecb.targetecms241119_18_user_testing_and_migration.en.pdf](#)

- Alle NZBen werden am **Freitag, den 13. Juni 2025 zum Tagesende die existierenden Sicherheitenbestände** nach ECMS migrieren.
- **Keine ausstehenden Transaktionen** am Migrationswochenende:
 - **Ein- und Auslieferungen müssen bis Freitag** bzw. bis zum noch bekanntzugebenden Termin abgeschlossen sein, ansonsten sind sie am folgenden Montag auszuführen.
 - Aktuell ist eine **Beteiligung** von allen Geschäftspartnern grundsätzlich **nicht** erforderlich (Ausnahme: bilaterale Absprachen)
 - **Freezing Periode:**
 - ✓ für CCBM-Bestände am Freitag,
 - ✓ für bilaterale Bestände: wird der Zeitpunkt noch gesondert mitgeteilt



Bitte beachten Sie für erfolgreiche Migrationsarbeiten sowie Testaktivitäten, dass Sie

- **nur die Aktivitäten durchführen, zu denen Sie aufgefordert werden,**
- **für die Ausführung der Aktivitäten nur die angegebenen Zeitfenster nutzen, und**
- **die ECMS Plattform nur öffnen, sofern diese zur Verfügung steht.**

Unerwünschte Aktivitäten (wie Nicht-Migrationsaufgaben) können zu Unterbrechungen führen oder den Test unnötig beeinträchtigen, der für die Validierung der Migrationsstrategie für die PROD von grundlegender Bedeutung sind

Ebenso können unerwünschte Aktivitäten in der Produktionsumgebung unerwartete Nebeneffekte vor und nach dem Go-live hervorrufen.

Anstehende Aktivitäten für Geschäftspartner	Zeitpunkt	Hinweis
Einrichtung von weiteren Institutsbenutzern/U2A Abschluss der noch ausstehenden Connectivity Tests Produktionsumgebung	Ab grünem Licht von der Bundesbank, voraussichtlich ab 01.03.2025 bis 28.03.2025	Pre-Migration-Phase
Vorbereitungswoche vor dem Migrationswochenende	02.06.2025 bis 13.06.2025	Keine Aktivitäten für Geschäftspartner
Migrationswochenende	14.06.2025 bis 15.06.2025	Aktivitäten am Wochenende nur für einzelne Geschäftspartner sofern bilateral vereinbart
1. Produktionstag ECMS	16.06.2025	
Post-Migration	16.06.2025 bis 17.06.2025	

Bei Fragen oder Anmerkungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. Einleitung
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
3. Testphasen – Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-live
- 5. Weiterführende Informationen**

- Die Bundesbank bietet **virtuelle Fachschulungen** in 2025 an.
- Das „**ECMS Kundenforum User Testing**“ hat sich etabliert.
 - ✓ **Ziel:** Austausch der Geschäftspartner zu testrelevanten Fragestellungen.
 - ✓ Die Bundesbank stellt eine Austauschmöglichkeit über die Plattform „**WebEx**“ bereit.
 - ✓ Die **virtuellen Veranstaltungen** finden am **zweiten Montag im Monat statt**.
 - ✓ Die **nächste Veranstaltung** ist für den **09. Dezember 2024** vorgesehen. Bei Interesse an einer Teilnahme senden Sie uns bitte eine E-Mail (ECMS@bundesbank.de).

Öffentliche Bundesbank-Informationen (in Deutsch & Englisch)

- Einführungsseite „ECMS Eurosystem Collateral Management System“
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system>
- Sammlung von 40+ BBk- und EZB-Publikationen in fünf unterschiedlichen Bereichen u. a. [ECMS User Handbook for Counterparties UHB V1.1](#) (eine Aktualisierung ist für Q 2 2025 angekündigt)
- Teilnehmerinformationen (Virtuelle BBk-Informationsveranstaltungen)
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/teilnehmerinformationen>
- Test und Migration (EZB-Infos)
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration>
- Dokumentation & FAQs (Funktionale / Technische / Weiterführende EZB / FAQs)
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms>
- [Harmonisierungsinitiativen](#) und [ECMS Community Readiness Monitoring](#).

Weiterführende Informationen der EZB

- www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/

Bei Fragen oder Anmerkungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.




Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.



Kontakt

Allgemeine Fragen zu ECMS


 069 9566 37030

Montag bis Freitag:
09:00 bis 15:00 Uhr

E-Mail: ECMS@bundesbank.de

Kontakt


Fragen zum ECMS Community
Readiness

 069 2388 2399

E-Mail: ECMS-readiness@bundesbank.de

Kontakt

Fragen zu Test und Migration

 069 2388 1315 (Hotline)

Montag bis Freitag:
13:00 bis 16:00 Uhr

E-Mail: ECMS-test@bundesbank.de

E-Mail: ECMS-migration@bundesbank.de
